



Betrieb

Präsentation am 16.05.2023

Planung

Bau

vor dem Betriebsausschuss des Landkreises Vechta

Projekt-
management

Service

Software

Unternehmen der **NETZKONTOR** Gruppe

Installation

Agenda

- Bisheriger Baufortschritt
- Baulosweise Aufschlüsselung Erfüllungsstand und Abrechnung
- Gesamtzahlen Ausbau 1 und 2
- Gesamterfüllungsstand Ausbau 1 und 2
- Projektterminplan
- „Graue-Flecken-Förderung“ (3. Ausbaustufe)
- Diskussion

Bisheriger Baufortschritt

Baulos 1 Holdorf

Ges. Tiefbau: ca.: 51,8 km

Fa. Osterhus

Tiefbau abgeschlossen

Innenbereiche POP 5 und POP7


Hausanschlüsse

Gesamt	333
Vertrag	225
Fertig	225

Gesamtfertigstellungsgrad: 100%

Abrechnungsstand zum LV: 113%

Abrechnungsstand zum Budget: 94%
(zum endgültigen Förderantrag)

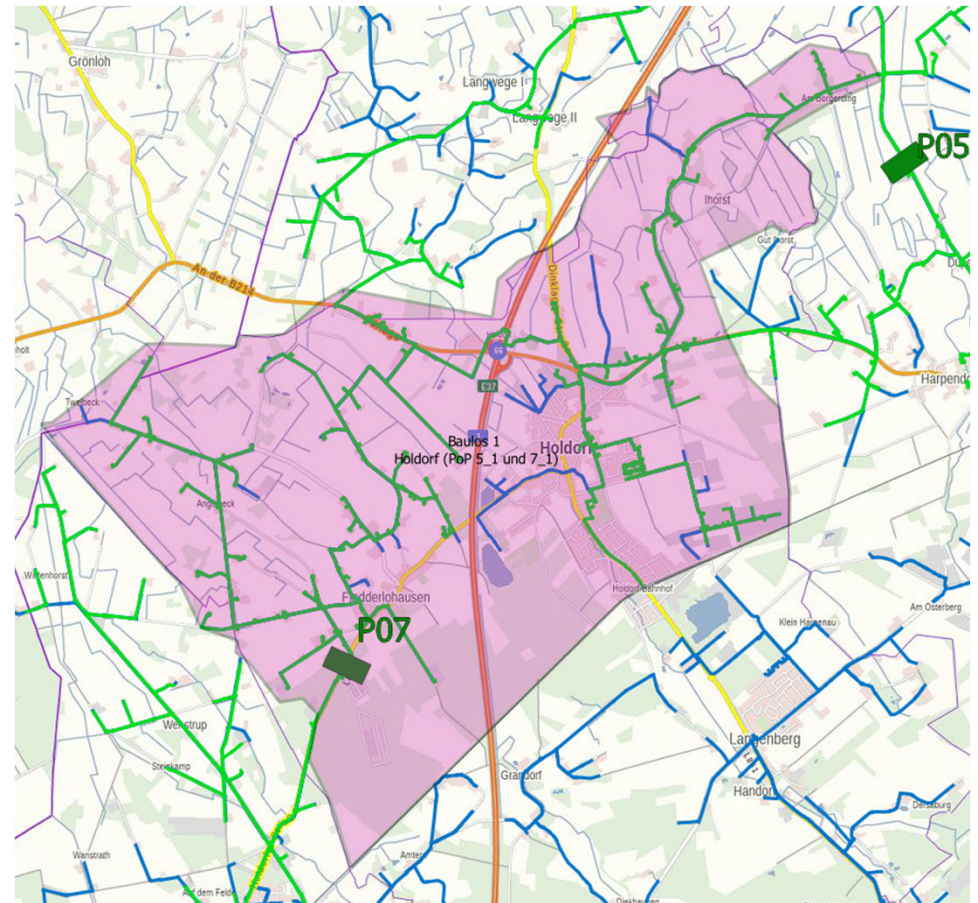

Baulos 3

Dinklage Holdorf Lohne Nk-Vörden Steinfeld

Gesamt Tiefbau: 92,3km

Fa. August Hotze Oldenburg

Tiefbau abgeschlossen

Aussenbereiche POP 5 und POP7


Hausanschlüsse

Gesamt	422
Vertrag	333
Fertig	333

Gesamtfertigstellungsgrad: 100%

Abrechnungsstand zum LV: 100%

Abrechnungsstand zum Budget: 100%
(zum endgültigen Förderantrag)

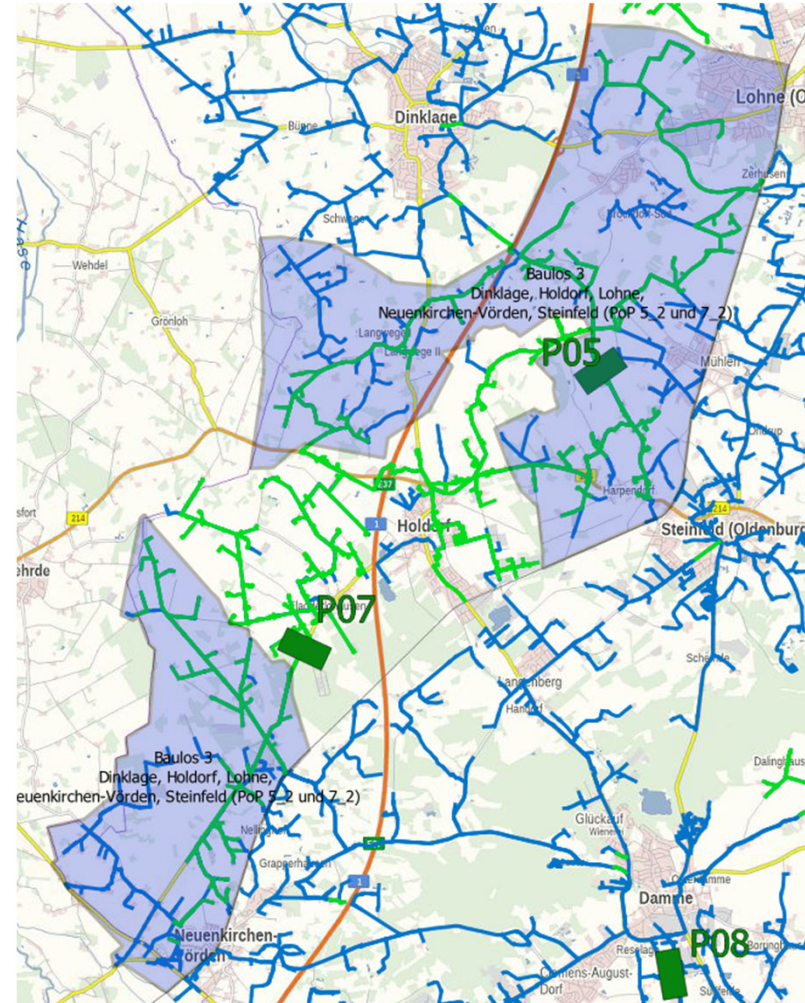

Baulos 4 Vechta Bakum Lohne

Gesamt Tiefbau: ca.: 142km

Fa. Allinq

Trassenbau fertig gestellt


Hausanschlüsse

Gesamt	1682
Vertrag	1105
Fertig	995
An Vodafone	212

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 95%

Abrechnungsstand zum LV: ca. 75%

Abrechnungsstand zum Budget: ca. 51%
(zum endgültigen Förderantrag)

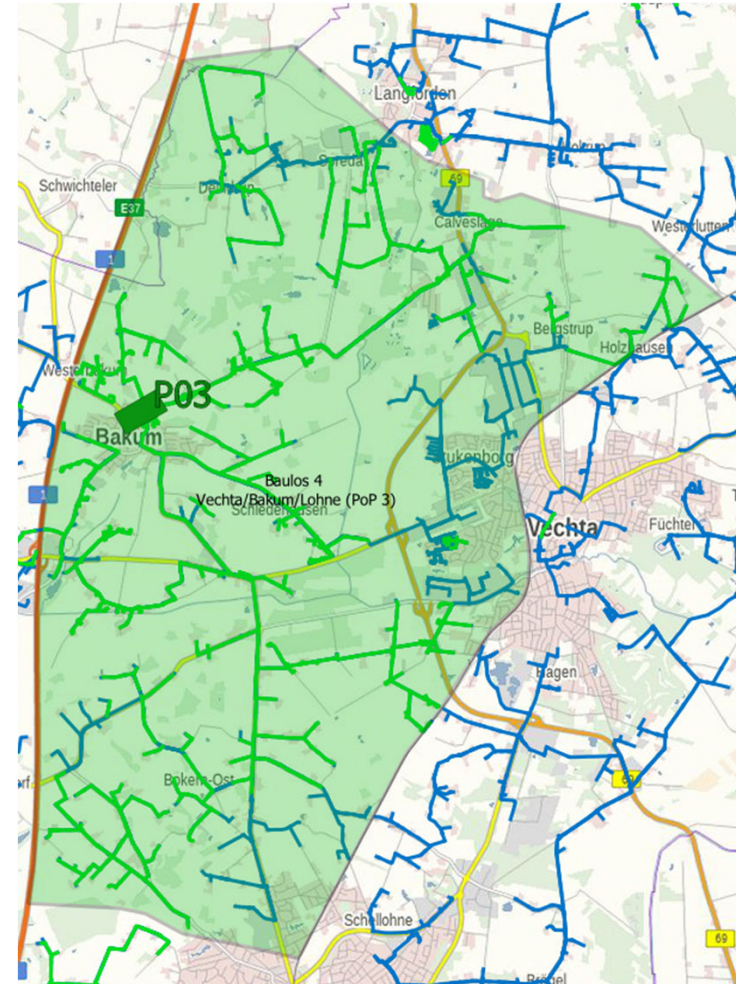

Baulos 5 Holdorf Nk-Vörden Damme

Gesamt Tiefbau: ca.: 225km

Fa. Lüders / Soltau

durchgeführter Tiefbau: 120 km


Hausanschlüsse

Gesamt	2144
Vertrag	1531
Fertig	517

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 47%

Abrechnungsstand zum LV: ca. 32%

Abrechnungsstand zum Budget: ca. 25%
(zum endgültigen Förderantrag)

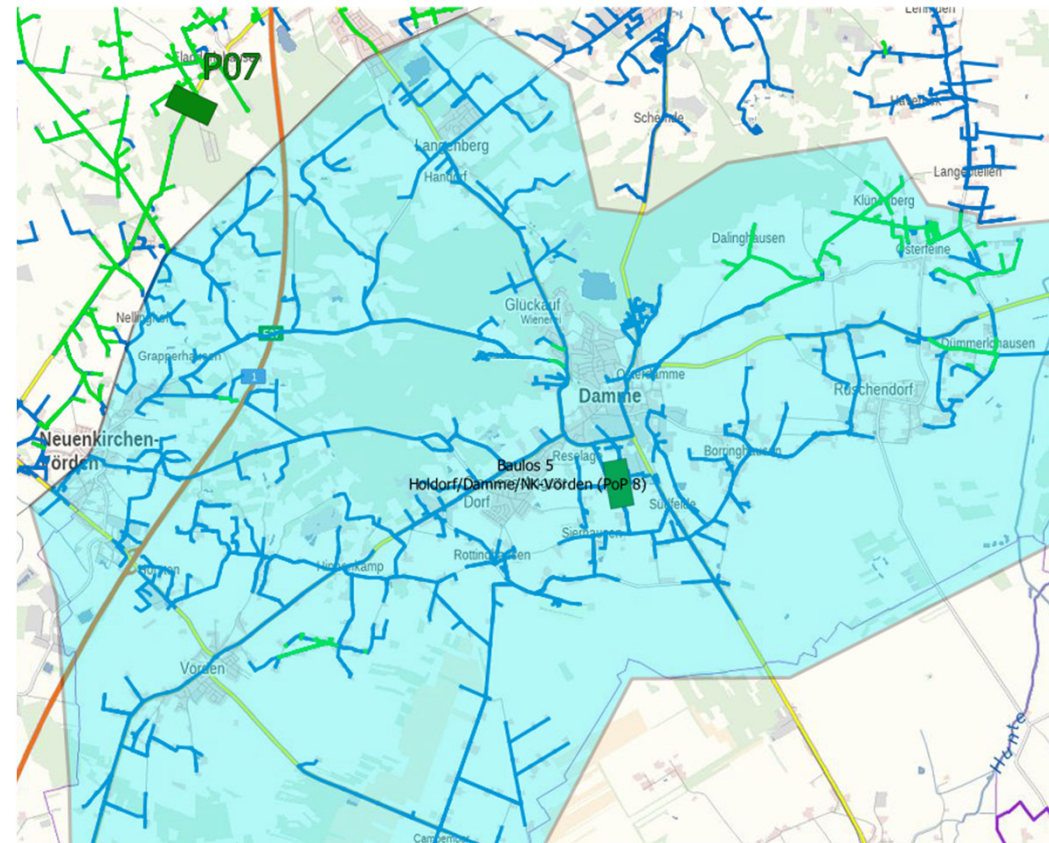

Baulos 6 Visbek Goldenstedt Vechta

Gesamt Tiefbau: ca.: 177km

Fa. Aytac / TBG Bau

Bereits durchgeführter Tiefbau: 125,6 km


Hausanschlüsse

Gesamt	1748
Vertrag	1264
Fertig	800

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 67%

Abrechnungsstand zum LV: ca. 81%

Abrechnungsstand zum Budget: ca. 63%
(zum endgültigen Förderantrag)

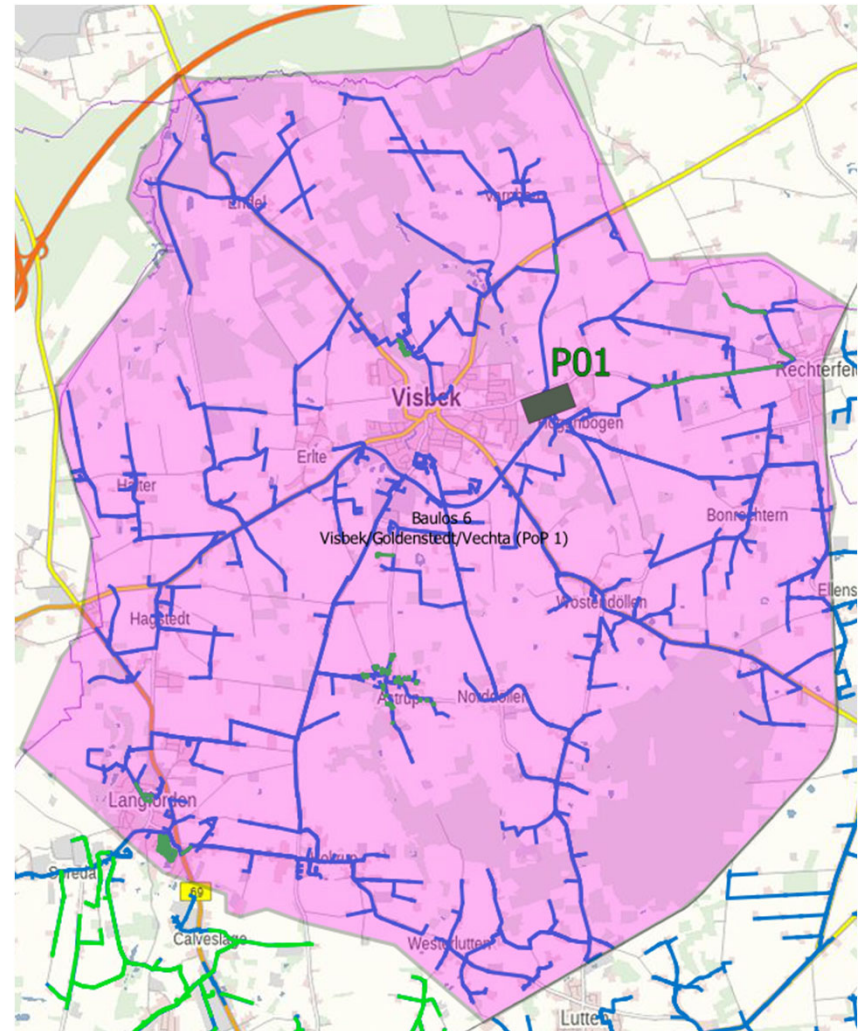

Baulos 7 Lohne Holdorf Steinfeld

Gesamt Tiefbau: ca.: 166km

Fa. Aytac / Furkan Bau

Bereits durchgeführter Tiefbau: 90,5 km


Hausanschlüsse

Gesamt	1960
Vertrag	1187
Fertig	347

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 47%

Abrechnungsstand zum LV: ca. 35%

Abrechnungsstand zum Budget: ca. 31%
(zum endgültigen Förderantrag)

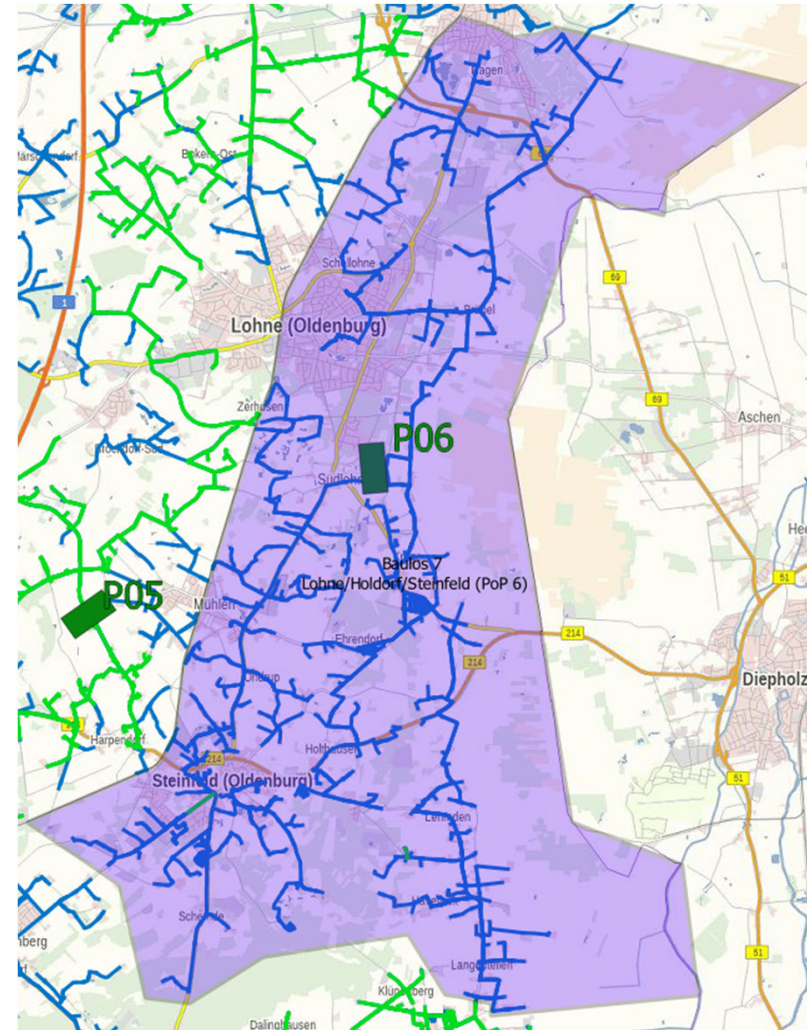

Baulos 8 Bakum Lohne Dinklage

Gesamt Tiefbau: ca.: 181km

Fa. Lüders / Soltau

Baustart 10.10.22

Bereits durchgeführter Tiefbau: 28,7 km

Hausanschlüsse

Gesamt 1332


Vertrag 973

Vertragsfortführung offen

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 12%

Abrechnungsstand zum LV: 0%

Abrechnungsstand zum Budget: 0%

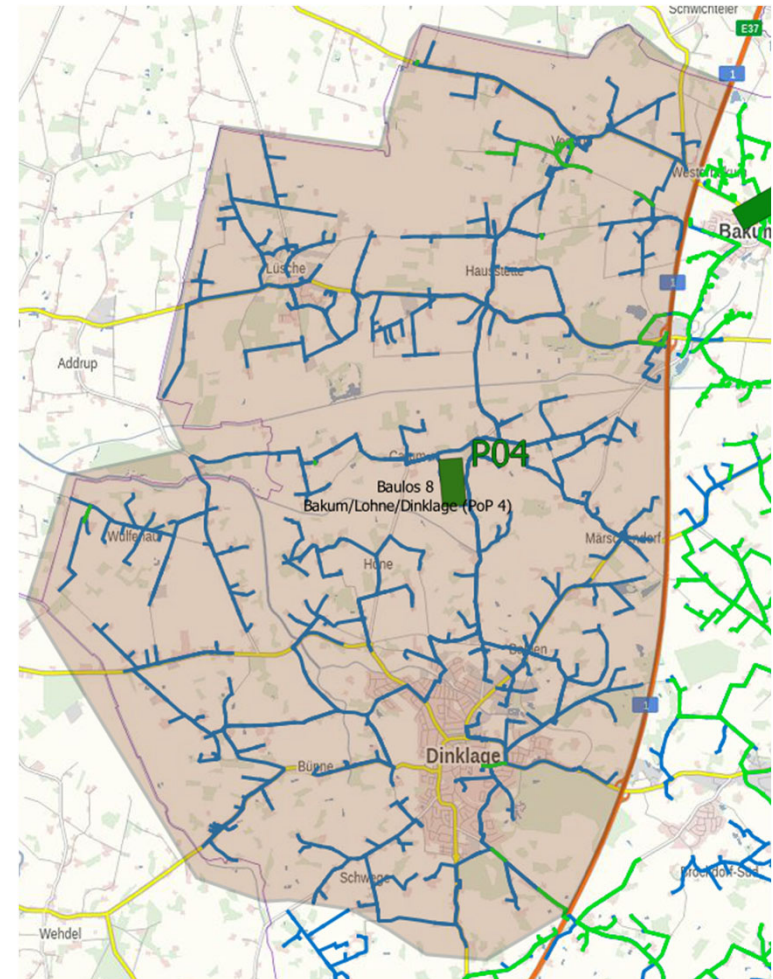

Baulos 9 Vechta Goldenstedt

Gesamt Tiefbau: ca.: 161km

Fa. Westenergie

Bereits durchgeführter Tiefbau: 82 km


Hausanschlüsse

Gesamt	1830
Vertrag	1219
Fertig	84

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 40%

Abrechnungsstand zum LV: 0%

Abrechnungsstand zum Budget: 0%
(zum endgültigen Förderantrag)

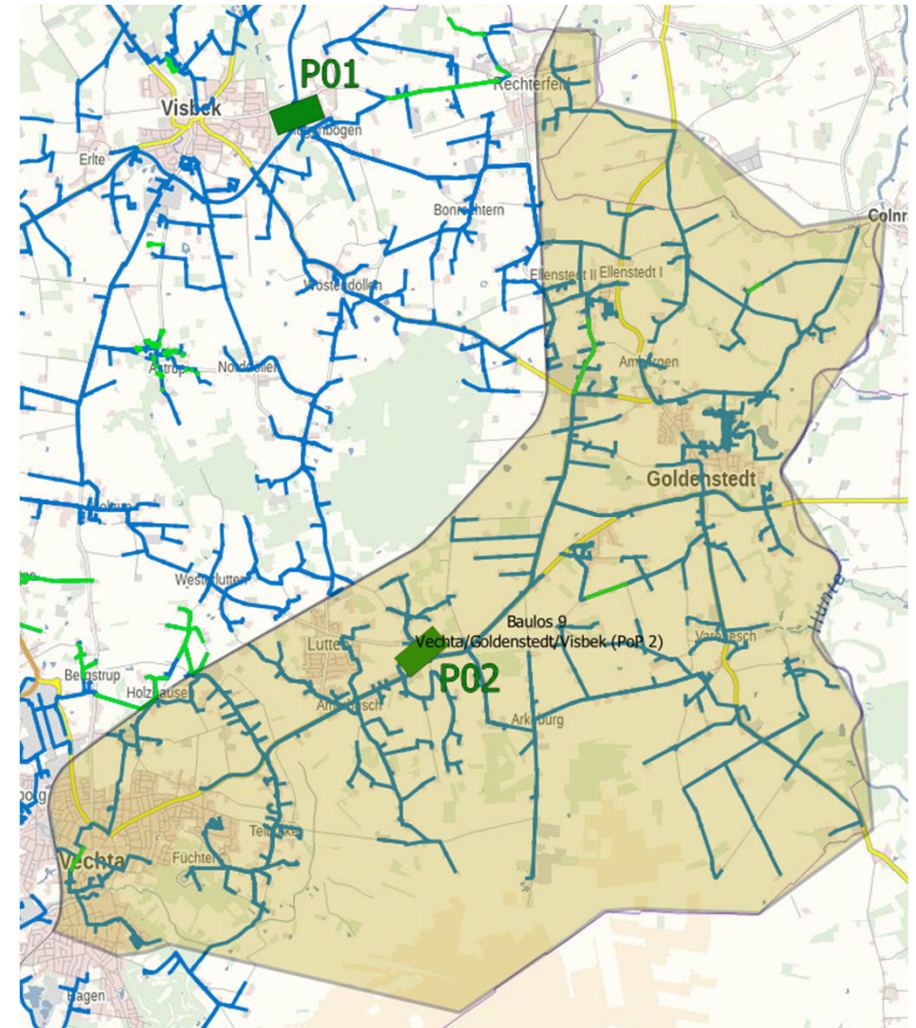

Baulos 10

Holdorf Dinklage Lohne Nk-Vörden Steinfeld

Gesamt Tiefbau: ca.: 52km

Baufirma HVF

Bereits durchgeführter Tiefbau: 23,5 km


Hausanschlüsse

Gesamt	337
Vertrag	228
Fertig	46

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 38%

Abrechnungsstand zum LV: ca. 13%

Abrechnungsstand zum Budget: ca. 11%
(zum endgültigen Förderantrag)

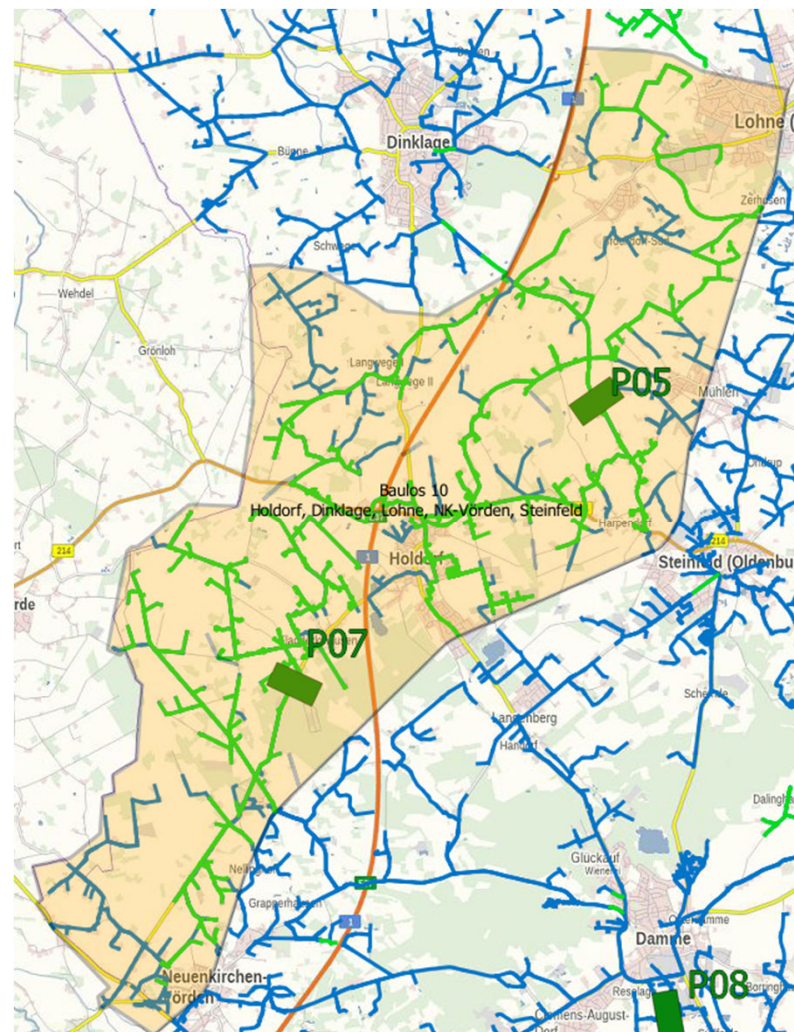

Gesamtzahlen Ausbau 1 und 2

Gesamt Tiefbau: 1.234 km

Bisher gebaut: 756,4 km


Alle acht POP Gebäude wurden gestellt

POP 3, 5, 7 und 6 in Betrieb

Anbindung zum Vodafone HVT aus Diepholz
kurz vor Abschluss

POP 8 Anschaltung in Q2/2023

584 Adressen an Vodafone zur Anschaltung
übergeben

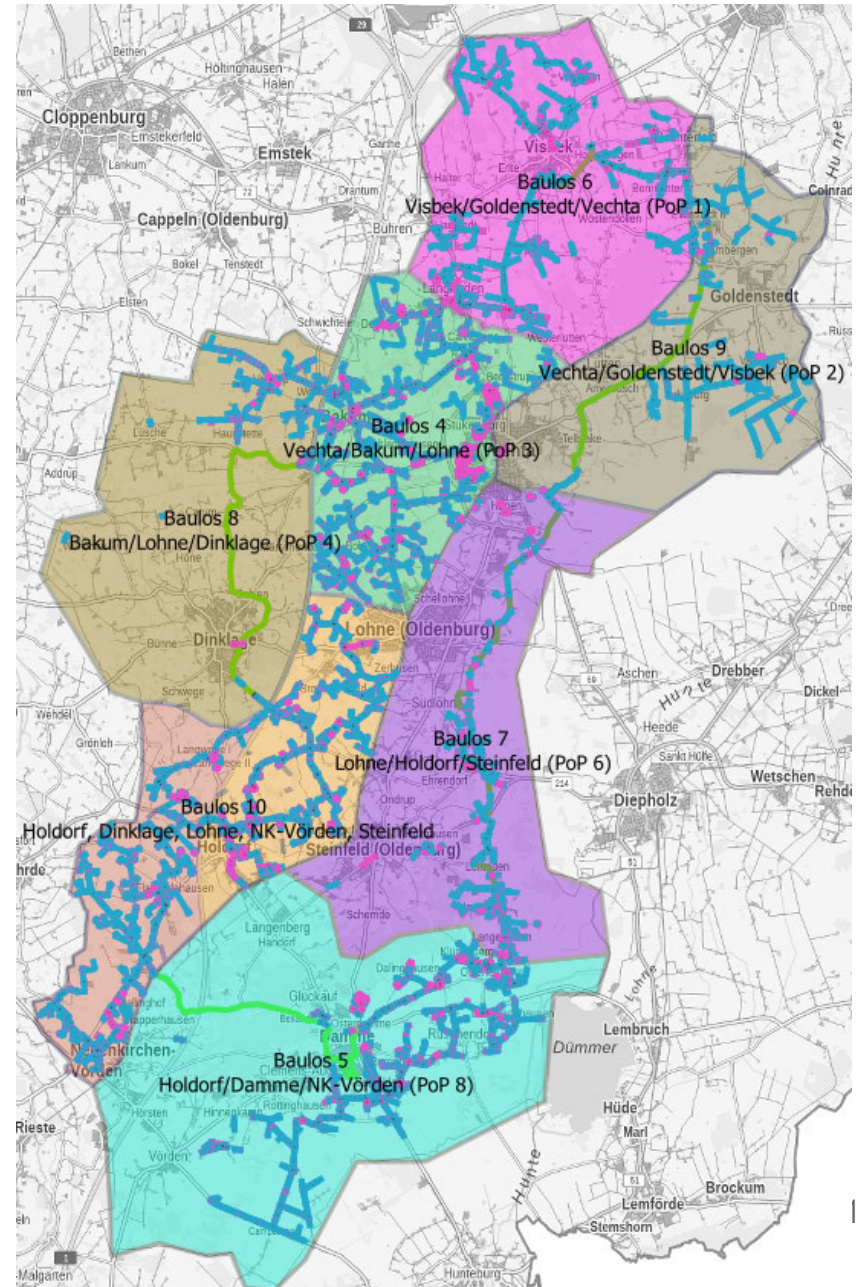


Gesamterfüllungsstand Ausbau 1 und 2

Gesamtfertigstellungsgrad: ca. 58%

Abrechnungsstand zum LV: ca. 41%

Abrechnungsstand zum Budget: ca. 33%
(zum endgültigen Förderantrag)

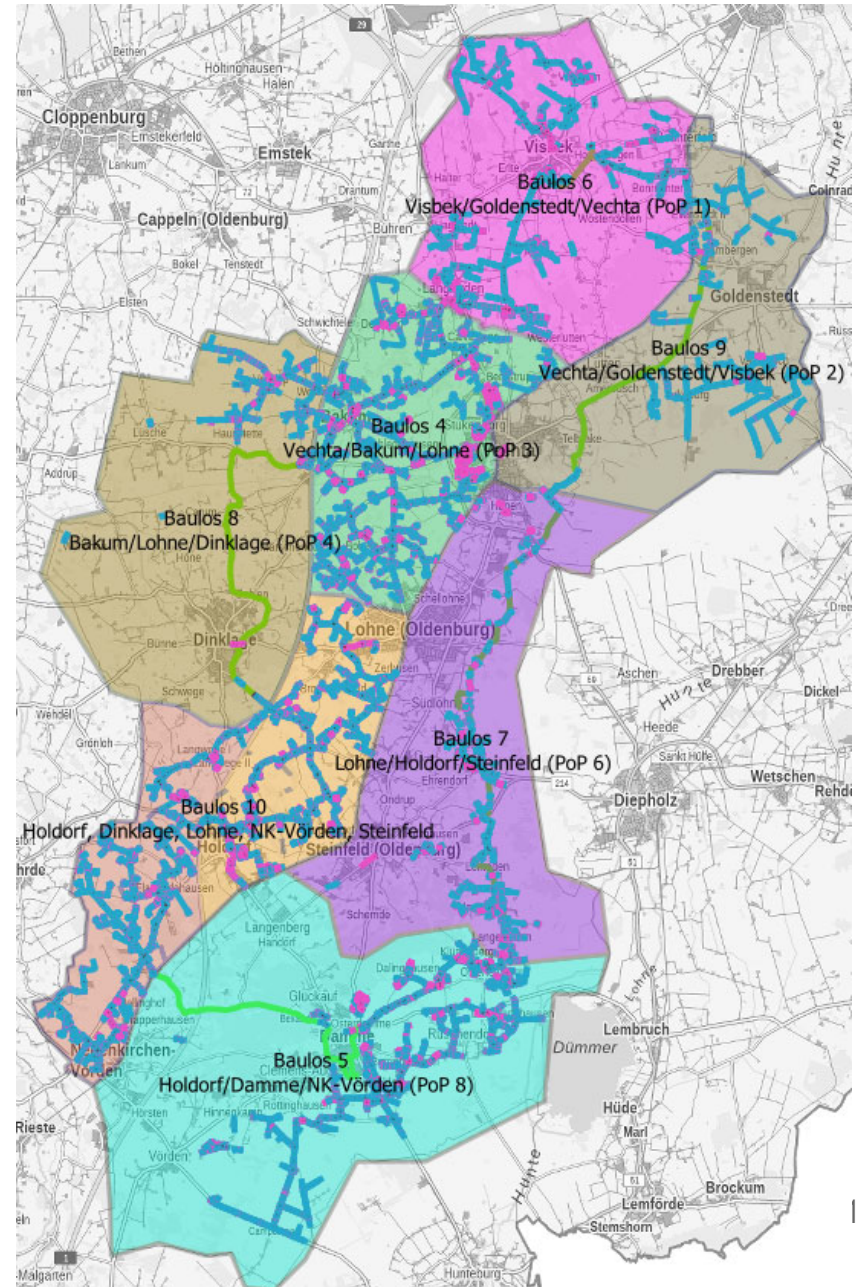

Projektterminplan

Baulos	POP-Bereich	Gemeinden	Ausschreibung ab	Baubeginn geplant	Baudauer 2020	Baudauer 2021	Baudauer 2022	Baudauer 2023
					09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 + 10	5+7	Holdorf/Dinklage/Neuenkirchen-Vörden	19.03.2020	14.09.2020		Baulos 1 (Adressen Ausbau 1)	Baulos 10 (Adressen Ausbau 2)	
2	Mitverlegung	gesamter Landkreis Vechta	19.03.2020	01.09.2020				
3 + 10	5+7	Neuenk.-Vörden/Dinklage/Steinfeld/Lohne	23.07.2020	08.02.2021		Baulos 3 (Adressen Ausbau 1)	Baulos 10 (Adressen Ausbau 2)	
4	3	Vechta/Bakum/Lohne	14.08.2020	15.02.2021				
5	8	Holdorf/Damme/Neuenk.-Vörden	24.06.2021	02.02.2022				
6	1	Visbek/Goldenstedt/Vechta	17.08.2021	01.03.2022				
7	6	Lohne/Holdorf/Steinfeld/Damme	15.09.2021	01.03.2022				
8	4	Bakum/Lohne/Dinklage	30.09.2021	15.03.2022				??
9	2	Vechta/Goldenstedt	12.11.2021	31.03.2022				

Hinweis: Die tatsächliche Ausbauezeit kann wegen nicht vorhersehbarer Umstände hiervon abweichen!

Legende:

 Ausbau 1
 Ausbau 1 und Ausbau 2

 erledigt bzw. begonnen
 gewünschtes Bauende Tiefbauer - noch nicht durch den AG bestätigt
 ?? Ergebnisoffenes Kündigungsverfahren durch den AG

Drittes Förderverfahren Landkreis Vechta

„Graue-Flecken-Förderung“ (3. Ausbaustufe)

Vorschlag Eigenbetrieb: Keine Weiterverfolgung eines „Masterplanes“, da dieser sehr schnell veraltet sein wird (u.a. Fortschritt eigenwirtschaftlicher Ausbau).

Im Rahmen einer ateneKOM-geförderten Beratungsleistung (Förderkonformität wird geprüft) erfolgt die komplette Adressprüfung des 3. Ausbaubereiches hinsichtlich eines förderkonformen „Graue-Flecken-Ausbaus“ sowie benachbarter „schwarzer Flecken“, die nach Vorgaben von atene KOM ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Diskussion:

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

netzkontor nord
Weil das Ergebnis zählt

VOSS
TELECOM SERVICES GMBH

BIBTECH

NETZKONTOR
GRUPPE

OpenXS
Erfolg planbar machen

ELEKTRONIK
HAMMER GmbH

SSF
Telekommunikations Management GmbH

MMD
MMD Multimedia Dienstleister

BFE

RT
Infrastruktur

IMT Medientechnik

MFB-COM
multimedialer Fernmeldebau

KLU
Kabel-, Leitungs- und
Umweltprojektebau

ladj

SAS
TeleService GmbH

Schneider & Partner
COMPUTER-VERNETZUNG GMBH

Kontakt:

BIBTECH

Dr. Hans Peter Schöne
Bassenbrink 11a
31552 Rodenberg

Phone: +49 5723 98961-61
Mobile: +49 176 238 24 118
E-Mail: schoene@bibtech.de
Homepage: www.bibtech.de

 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Präsentation drucken

Netzkontor Gruppe und/oder deren Mitarbeiter:innen erbringen weder rechtliche noch steuerliche Beratungsleistungen und schließen die Haftung für jede erdenkliche Fragestellung explizit aus.

NETZKONTOR
GRUPPE

16.05.2023
