

NETZKONTOR
G R U P P E

B·I·BTECH

 Breitbandinitiative
Landkreis Vechta
ZEHN KOMMUNEN - EIN LANDKREIS

Betrieb

Präsentation am 12.09.2023

Planung

Bau

vor dem Betriebsausschuss des Landkreises Vechta

Projekt-
management

Service

Software

Unternehmen der **NETZKONTOR** Gruppe

Installation

Agenda

- Bisheriger Baufortschritt
- Geplanter Projektzusammenschluss Ausbau 1 und 2
- Historie zu Ausbau 1 und Ausbau 2
- Ergebnisse der vergangenen Abstimmungen ateneKOM
- Ergebnisse der aktuellen Abstimmung ateneKOM vom 12.07.2023
- Diskussion

Bisheriger Baufortschritt

Baulos 1 Holdorf

Ges. Tiefbau: ca.: 51,8 km


Fa. Osterhus

Tiefbau abgeschlossen

Innenbereiche POP 5 und POP7

Hausanschlüsse

Gesamt	333
Vertrag	225
Fertig	225

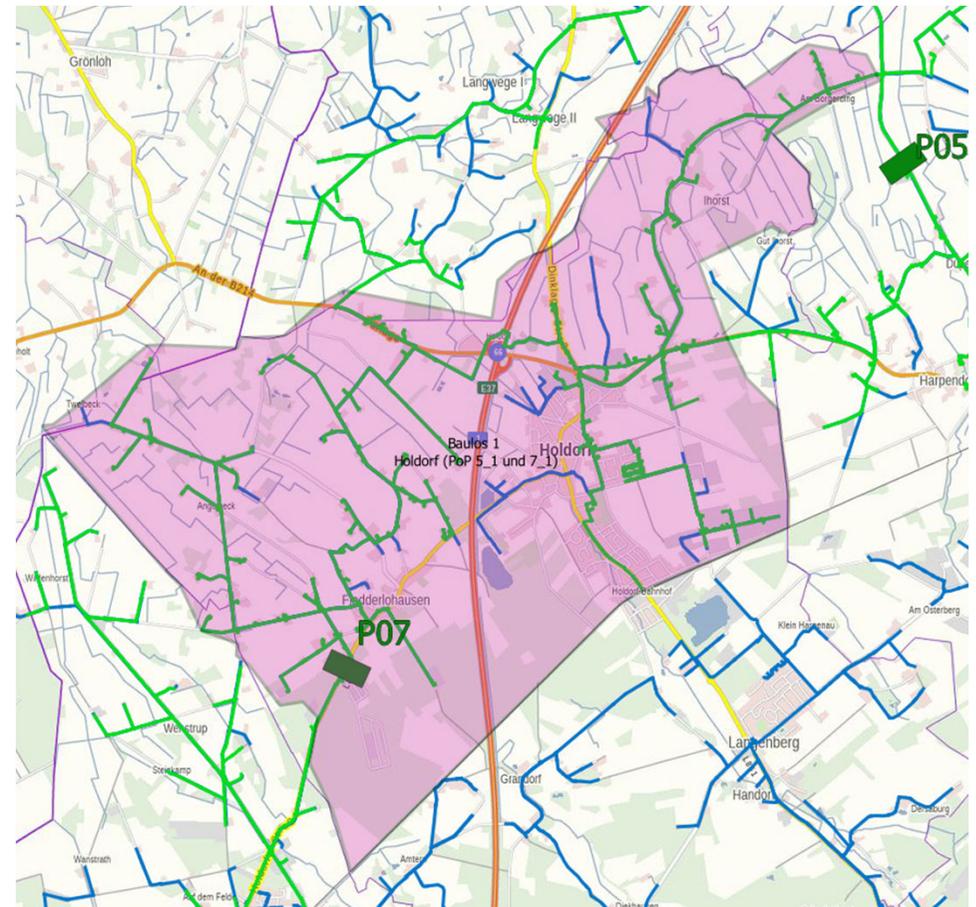

Baulos 3

Dinklage Holdorf Lohne Nk-Vörden Steinfeld

Gesamt Tiefbau: 92,3km


Fa. August Hotze Oldenburg

Tiefbau abgeschlossen

Aussenbereiche POP 5 und POP7

Hausanschlüsse

Gesamt	422
Vertrag	333
Fertig	333

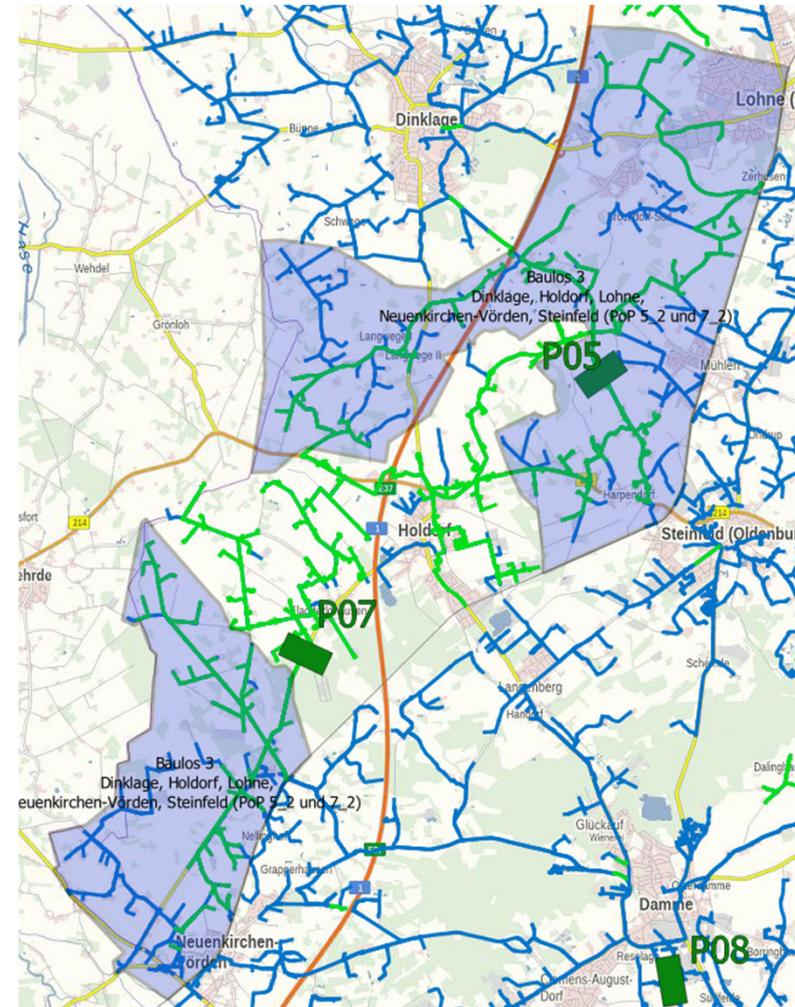

Baulos 4 Vechta Bakum Lohne


Gesamt Tiefbau: ca.: 142km

Fa. Allinq

Trassenbau fertig gestellt

Hausanschlüsse

Gesamt	1682
Vertrag	1105
Fertig	1105
An Vodafone	1095

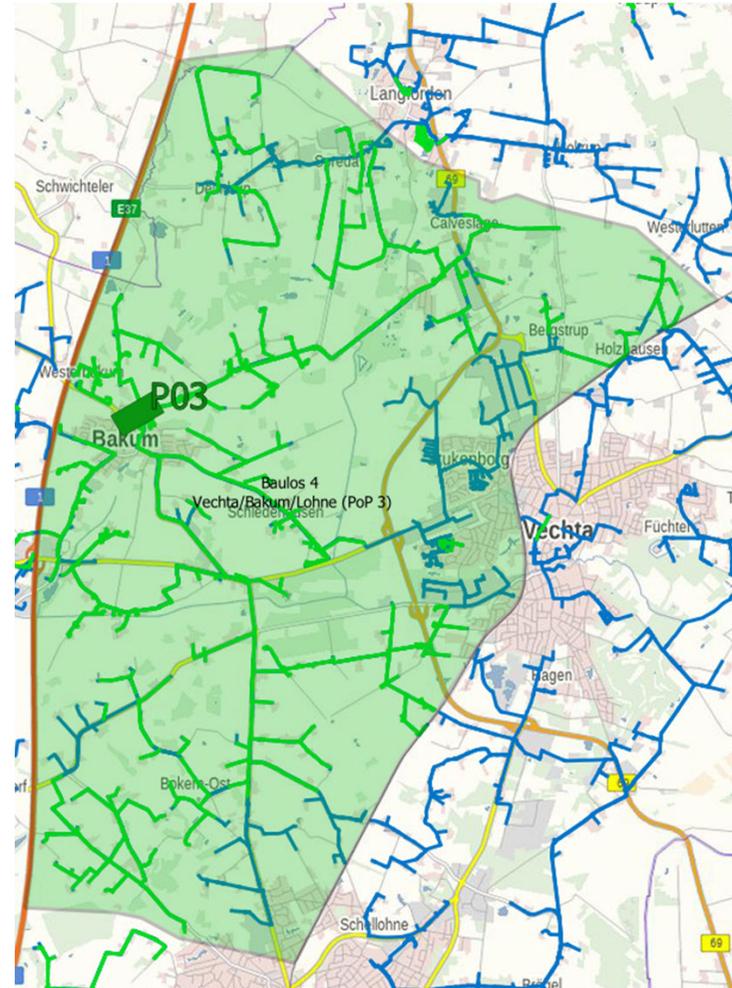

Baulos 5 Holdorf Nk-Vörden Damme

Gesamt Tiefbau: ca.: 225km

Fa. Lüders / Soltau

durchgeführter Tiefbau: 154,2 km


Hausanschlüsse

Gesamt	2144
Vertrag	1531
Fertig	663

Mangelhafte Arbeit der Baufirma:

Setzt sich fort vom Baulos 8

Ergebnis offenes Kündigungsverfahren durch den AG

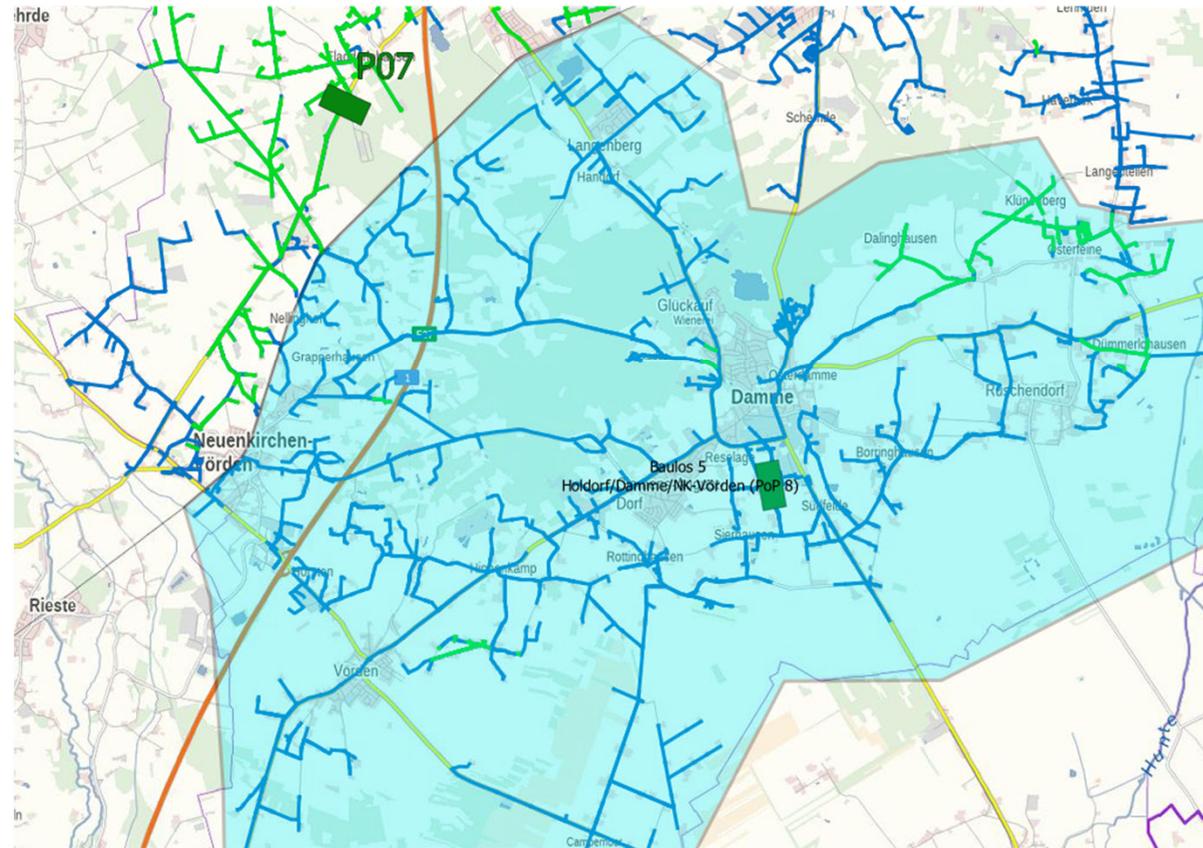

Baulos 6 Visbek Goldenstedt Vechta


Gesamt Tiefbau: ca.: 169km

Fa. Aytac / TBG Bau

Tiefbau abgeschlossen

Hausanschlüsse

Gesamt	1748
Vertrag	1264
Fertig	1144
An Vodafone	634

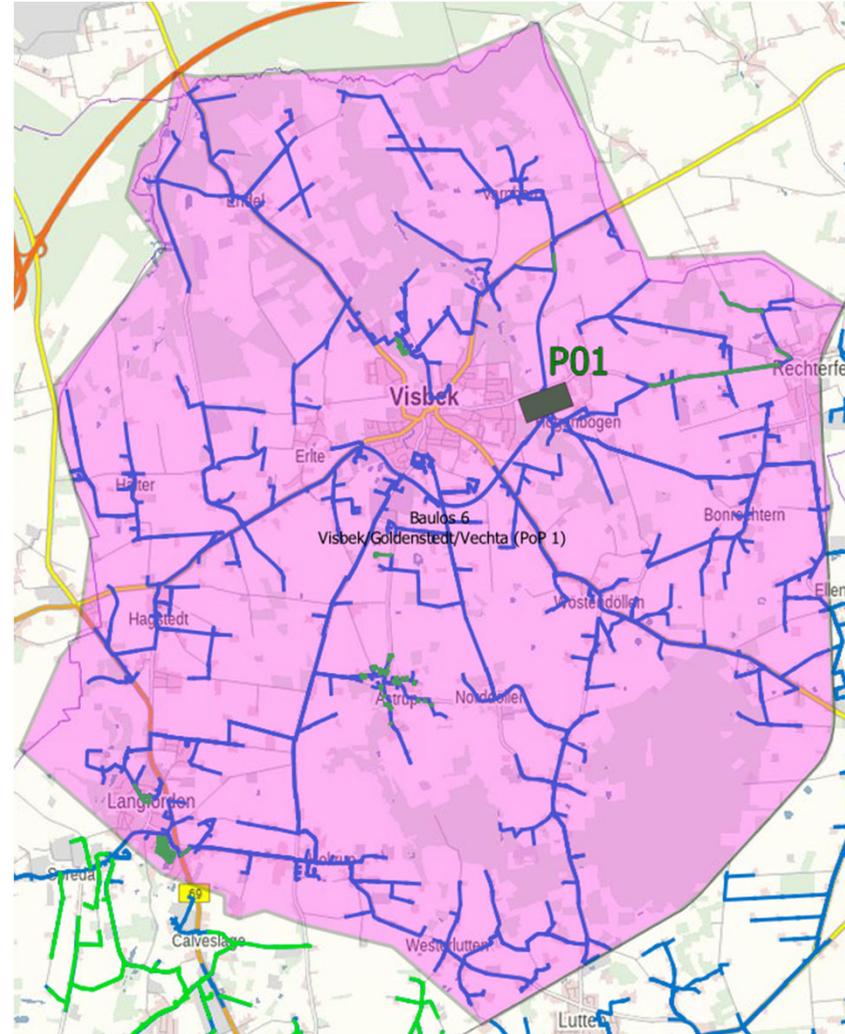

Baulos 7 Lohne Holdorf Steinfeld


Gesamt Tiefbau: ca.: 219km

Fa. Aytac / Furkan Bau

Bereits durchgeführter Tiefbau: 175km

Hausanschlüsse

Gesamt	1548
Vertrag	1202
Fertig	347

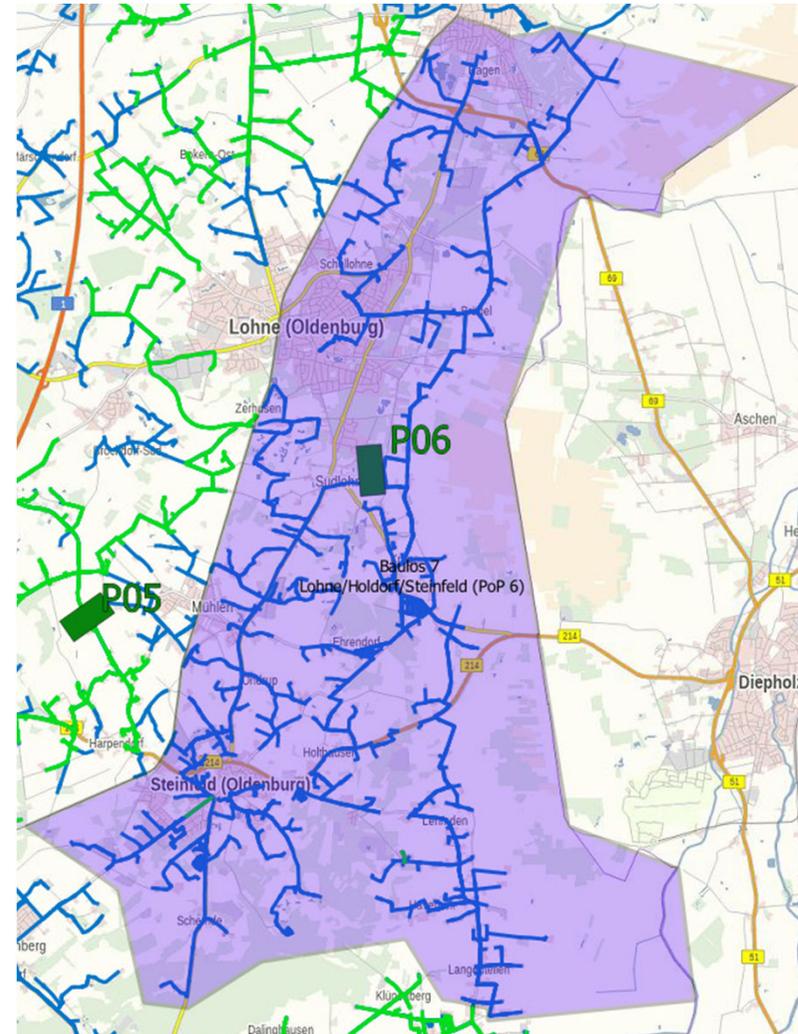

Baulos 8 Bakum Lohne Dinklage

Gesamt Tiefbau: ca.: 181km


Fa. Lüders / Soltau

Bereits durchgeführter Tiefbau: 28,7 km

Hausanschlüsse

Gesamt	1332
Vertrag	973

Kündigung ausgesprochen

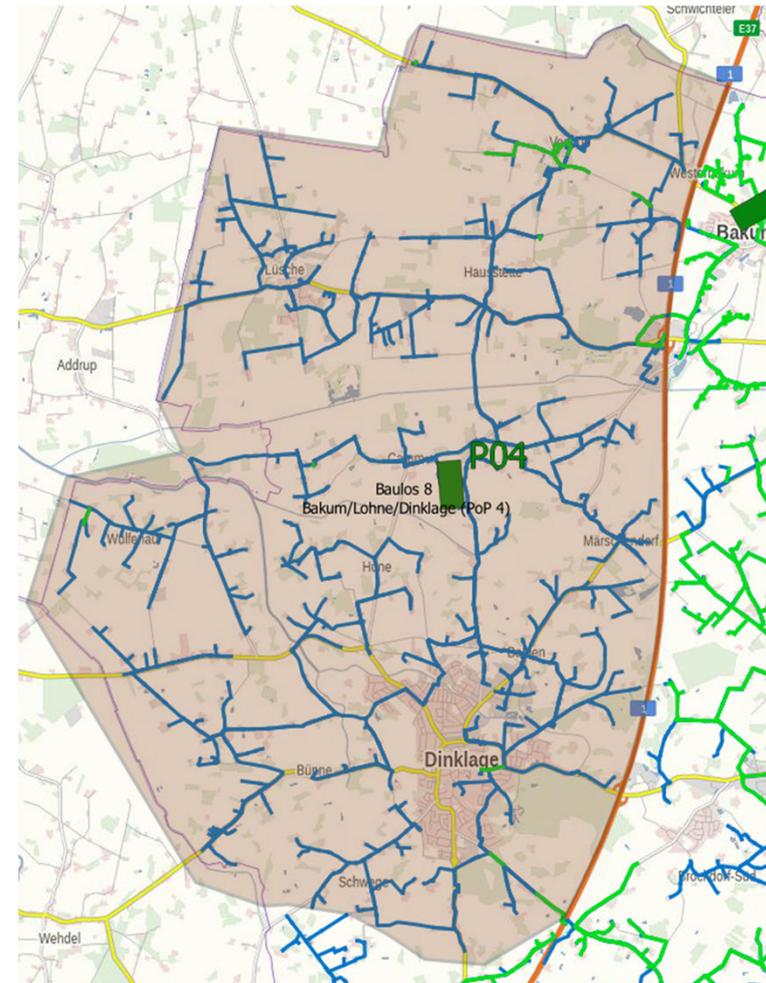


Baulos 8.1 Bakum Lohne Dinklage

Gesamt Tiefbau: ca.: 147km

Hausanschlüsse

Gesamt	1332
Vertrag	973

Neue Ausschreibung in Vorbereitung

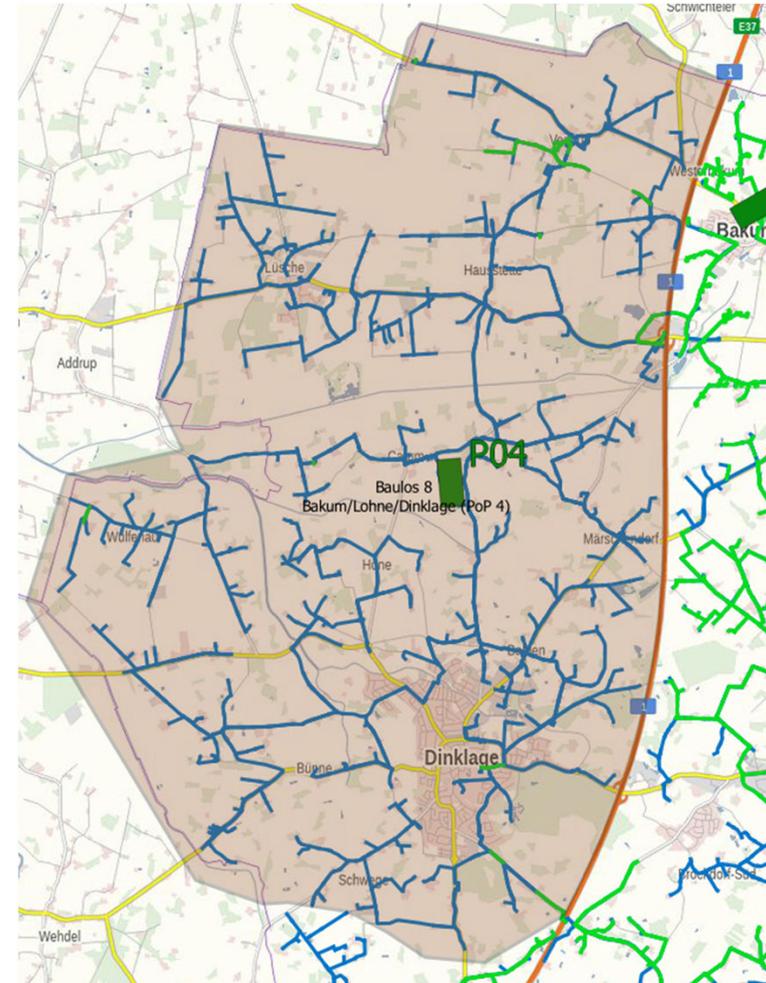

Baulos 9 Vechta Goldenstedt


Gesamt Tiefbau: ca.: 161km

Fa. Westenergie

Bereits durchgeführter Tiefbau: 114 km

Hausanschlüsse

Gesamt	1830
Vertrag	1219
Fertig	84

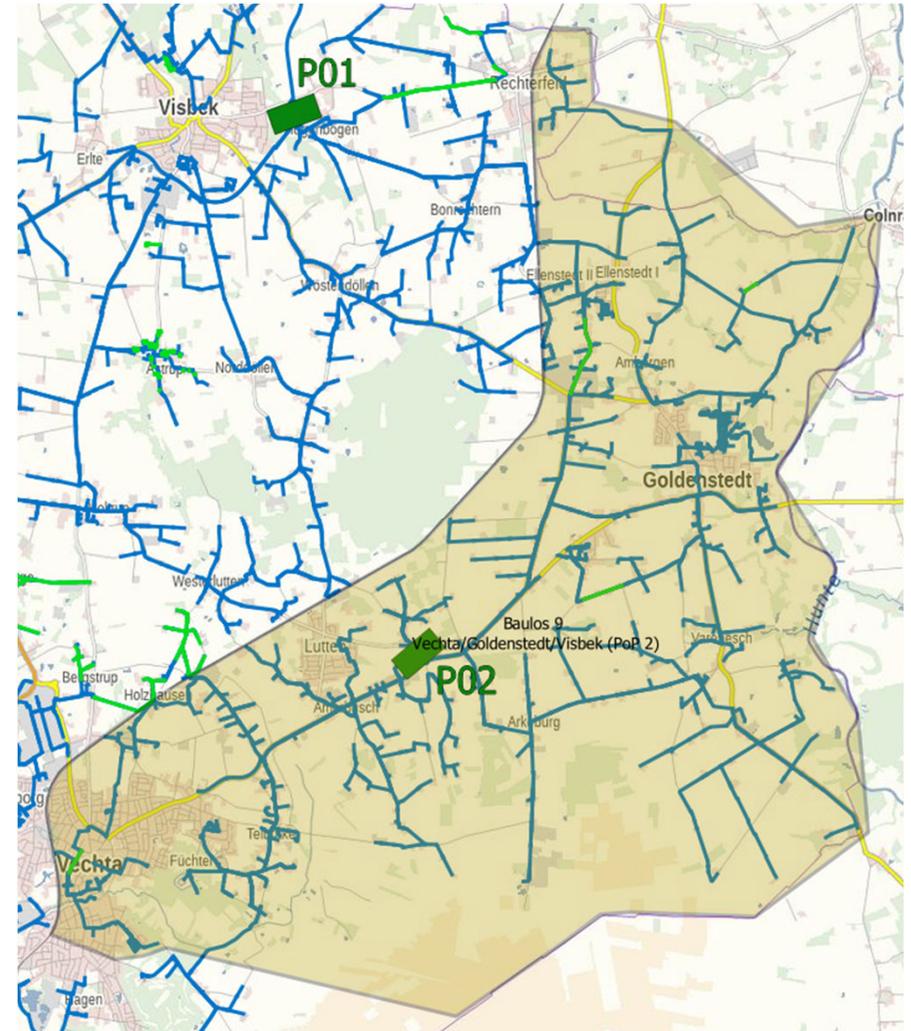

Baulos 10

Holdorf Dinklage Lohne Nk-Vörden Steinfeld


Gesamt Tiefbau: ca.: 52 km

Baufirma HVF

Bereits durchgeführter Tiefbau: 48 km

Hausanschlüsse

Gesamt	337
Vertrag	228
Fertig	170

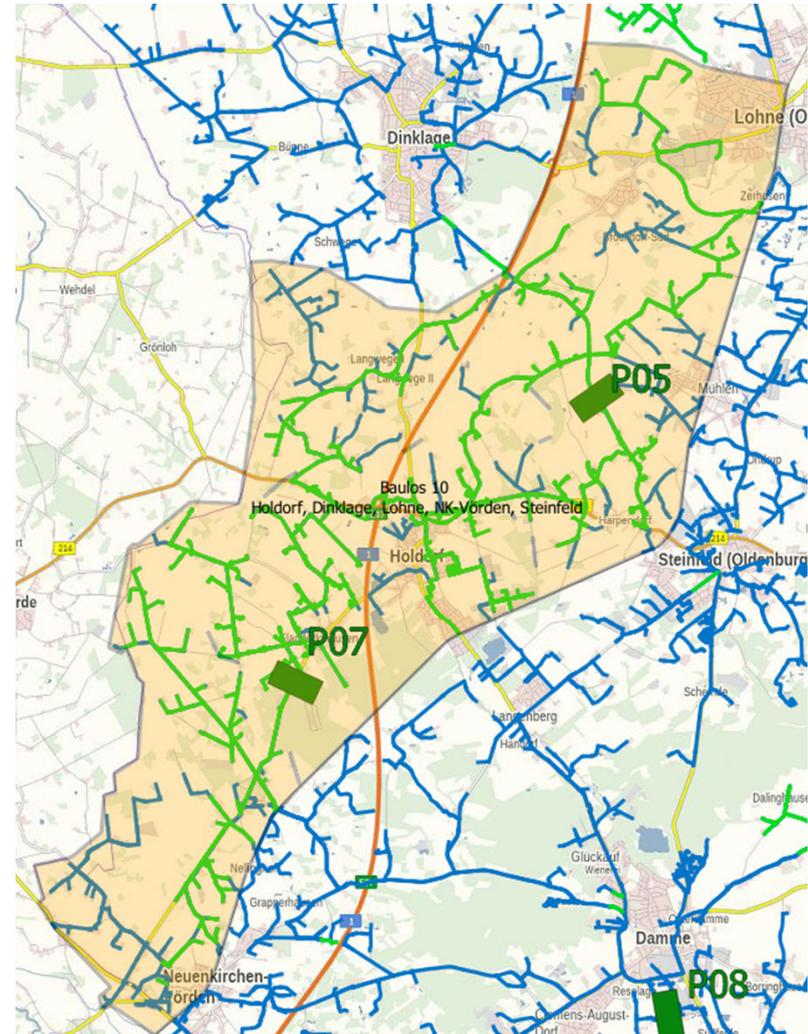

Geplanter Projektzusammenschluss Ausbau 1 und 2

Historie zu Ausbau 1 und Ausbau 2:

Ausbau 1

Förderantrag: 28.10.2016

Förderbescheid: 21.03.2017

Abstimmungen ateneKOM: 19.12.2019

Baubeginn: 28.07.2020

Abstimmungen ateneKOM: 14.12.2020

Abstimmungen Nbank: 12.01.2021

Abstimmungen ateneKOM: 13.07.2023

Ausbau 2

Förderantrag: 10.05.2019

Förderbescheid: 20.08.2019

Abstimmungen ateneKOM: 19.12.2019

Abstimmungen ateneKOM: 14.12.2020

Abstimmungen Nbank: 12.01.2021

Baubeginn: 28.01.2021

Abstimmungen ateneKOM: 13.07.2023

Ergebnisse der vergangenen Abstimmungen ateneKOM:

ateneKOM 17.12.2019: Vorstellung der Projekte Ausbau 1 und Ausbau 2 unter Leitung von Landrat Winkel, ateneKOM: Nutzung der 2 Fördertöpfe

ateneKOM 14.12.2020: ateneKOM: „Wichtig ist die klare Zuordnung der Ausgaben und Einnahmen pro Förderprojekt. Bei Beantragung des finalen Förderbescheids und bei der Abrechnung müssen die Kosten klar getrennt dargestellt sein.“

Ergebnisse der aktuellen Abstimmung ateneKOM vom 12.07.2023:

1. Hohe Wertschätzung für die aufwendige Abrechnungstrennung der Ausbaustufen 1 und 2 durch die BIB TECH
2. Die Aufwendungen für die Trennung der Ausbaustufen 1 und 2 bei der Abrechnung sind zu hoch, es muss nach neuen Wegen gesucht werden: Vorschlag **Projektzusammenlegung Ausbau 1 und 2**
3. Der Vorschlag der ateneKOM-Besprechungsteilnehmer auf Projektzusammenlegung wurde von der Geschäftsführung der ateneKOM **am 13.07.2023 bestätigt**
4. **Abschlussdokumente für die Fördervorhaben Ausbau 1 und Ausbau 2 vorbereiten, dann Stellung eines neuen Projektantrages** mit kompletten zusammengelegten GIS-Netzplan-Daten (aktueller Stand: KW38-Daten Nachforderungen Ausbau 1 fertig, KW39- Daten Nachforderungen Ausbau 2 fertig, dann Arbeit der ateneKOM)
5. **Keine Zusammenlegung mit Ausbau 3** möglich, da dies die Graue-Flecken-Förderung betrifft im Gegensatz zur Weißen-Flecken-Förderung der Ausbaustufen 1 und 2 mit anderen Förderauflagen

Diskussion:

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

netzkontor nord
Weil das Ergebnis zählt

VOSS
TELECOM SERVICES GMBH

BIBTECH

NETZKONTOR
GRUPPE

OpenXS
Erfolg planbar machen

ELEKTRONIK
HAMMER GmbH

SSF
Telekommunikations Management GmbH

RT
Infrastruktur

MMD
MMD Multimedia Dienstleister

IMT Medientechnik

EFB

MFB-COM
Infrarot- und
Fernmeldebau

KLU
Kabel-, Leuchte- und
Umweltprojektebau

ladj

SAS
TeleService GmbH

Schneider & Partner
COMPUTERNETZUNG GMBH

Kontakt:

BIBTECH

Dr. Hans Peter Schöne
Bassenbrink 11a
31552 Rodenberg

Phone: +49 5723 98961-61
Mobile: +49 176 238 24 118
E-Mail: schoene@bibtech.de
Homepage: www.bibtech.de

 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Präsentation drucken

Netzkontor Gruppe und/oder deren Mitarbeiter:innen erbringen weder rechtliche noch steuerliche Beratungsleistungen und schließen die Haftung für jede erdenkliche Fragestellung explizit aus.

NETZKONTOR
GRUPPE

12.09.2023
