

# Kreisstraße K267, Schwege Fahrbahnsanierung und Radweg-Neubau

21.09.2023  
Bau-, Struktur- und  
Umweltausschuss







Straße: K267, Abschnitt: 33140170 - 33140210, Station: 2095, Lage: R, FS: 1

# Rückblick / Zeitschiene

**10/2018 Übergabe Unterschriftenliste an Landrat**

**05/2019 Grundsatzbeschluss Bauausschuss Landkreis**

-> neue Radwege 2,50m breit

-> parallel bauen, wenn Fahrbahn grundhaft saniert wird

**10/2019 Planungsbeschluss für Radweg Bauausschuss Landkreis**

**11/2019 Vermessungsarbeiten Neubaustrecke**

**05/2020 Vorplanung / Tragfähigkeitsmessungen / Bodenanalysen**

**06/2021 Antrag / Bewilligung Fördermittel**

**01/2022 Bearbeitung/Kartierung Landschaftspflegerischer Begleitplan**

**03/2022 Anliegerversammlung -> allgemeine Zustimmung**

# Rückblick / Zeitschiene

**07/2022** Planverzichtsverfahren -> *ohne Beschluss beendet*

**09/2022** Straßenbereisung BSU/KTA

**12/2022** Antrag UWG/Die Linke abgelehnt -> Beschluss BSU -> 6m Fahrbahnbreite

....seitdem....

**03/2023** Nachkartierung / Potentialansprache Brutvögel u. Fledermäuse

Planungsänderungen zum Erhalt von Wallhecken und Bäumen

Grunderwerbsverhandlungen

**09/2023** BSU-Sitzung



# Erforderliche Baumfällungen

## Laut Gutachten Büro Nordlohne&Bechly (Juli 2022):

ca. 65x	Schwarzerle,	davon ca. 55x Durchmesser 10-40 cm,	10x ca. 50cm
ca. 45x	Stileiche,	davon ca. 30x Durchmesser 10-40 cm,	2x ca. 100cm
ca. 70x	Sandbirke,	davon ca. 60x Durchmesser 10-40 cm,	10x 50-60cm
ca. 10x	Vogelkirsche/Weiden/Weißdorn,	Durchmesser 10-40cm	

Σca. 190 Bäume

## Umplanung in 2 Bereichen:

**Bau-km 2+580 bis 2+830 (ca. 250m) Verlegung Radweg auf vorhandenen Wald-/Rückeweg**

**Bau-km 3+500 bis 3+750 (ca. 250m) Erhalt Wallhecke mit Baumbestand/Bewuchs**

- ▶ umfangreicher Grunderwerb notwendig
- ▶ ca. 50 Bäume können erhalten werden


Bau-km 2+580 bis 2+830 (ca. 250m) Verlegung Radweg auf vorhandenen Wald-/Rückeweg



\_\_\_\_\_  
Straße: K267, Abschnitt: 33140170 - 33140210, Station: 1160, Lage: R, FS: 1

K267, Dinklage/Schwege / BSU 21.09.23

Bau-km 2+580 bis 2+830 (ca. 250m) Verlegung Radweg auf vorhandenen Wald-/Rückeweg

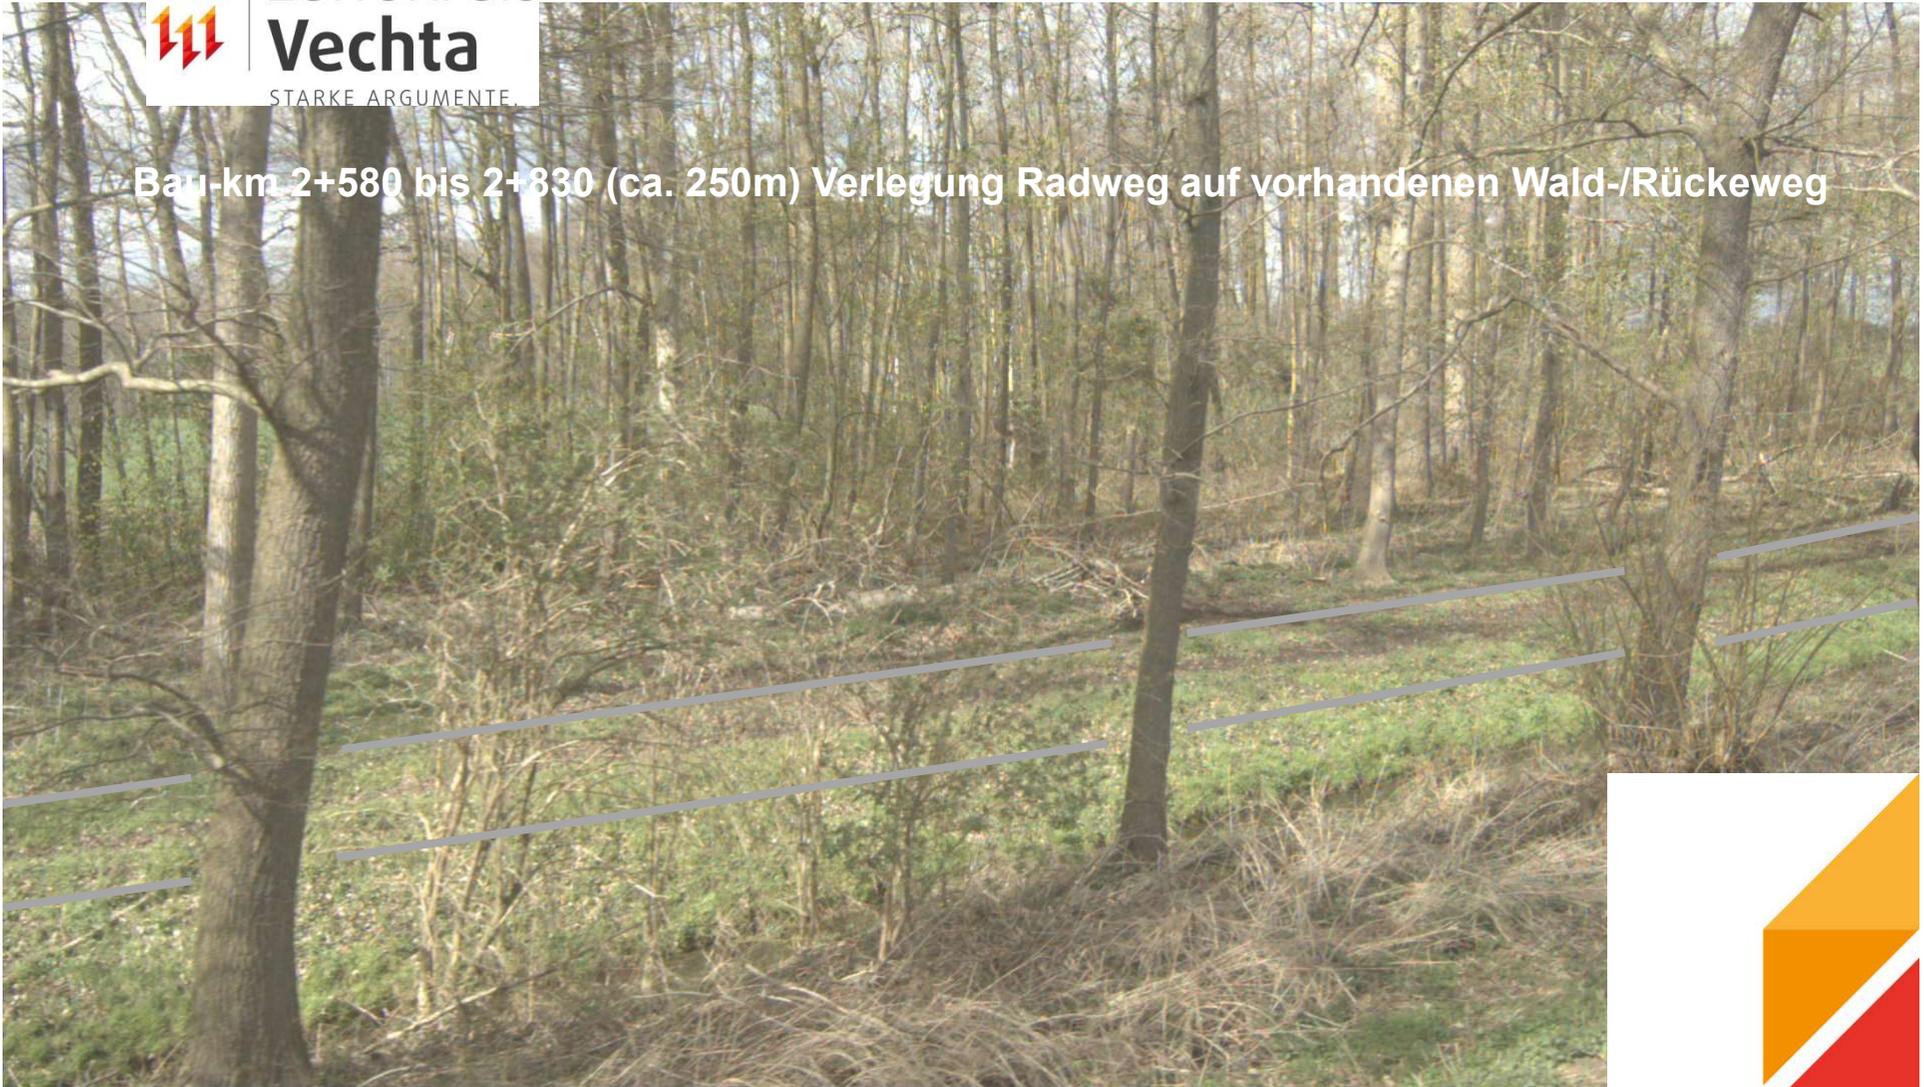

Straße: K267, Abschnitt: 33140170 - 33140210, Station: 1160, Lage: R, FS: 1

**Bau-km 3+500 bis 3+750 (ca. 250m) Erhalt Wallhecke mit Baumbestand/Bewuchs**



\_\_\_\_\_  
Straße: K267, Abschnitt: 33140170 - 33140210, Station: 120, Lage: R, FS: 1

K267, Dinklage/Schwege / BSU 21.09.23

**Fahrbahnverbreiterung auf 6 m, Absicherung durch Schutzplanken**



\_\_\_\_\_  
Straße: K267, Abschnitt: 33140170 - 33140210, Station: 120, Lage: R, FS: 1

K267, Dinklage/Schwege / BSU 21.09.23

# Beschlussvorschlag

*„Dem Kreistag wird empfohlen, die Verwaltung mit der Durchführung des Planfeststellungsverfahrens für die Fahrbahn-Grundsanie rung und den parallel geplanten Radweg-Neubau entlang der Kreisstraßen K267 in Dinklage/Schwege bis zur Kreisgrenze Osnabrück zu beauftragen und die bauliche Umsetzung unter Berücksichtigung der Förderrichtlinie gemäß Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (N-GVFG) für das Jahr 2025 vorzusehen.“*
